



III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020

za rok 2018



Opracowanie:
Biuro Zarządzania
Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

Czerwiec 2019



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	4
2. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY	5
3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020.....	6
4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020.....	8
4.1 ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ).....	9
5.PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - POZAKONKURSOWE.....	16
5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓLWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ZIT KOF	21
5.2. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020	21
5.3. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA.....	23
5.3.1 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR , podpisane w 2018 roku.....	23
5.3.2. Wnioski o płatność złożone do końca 2018 roku, dla projektów EFRR.....	26
5.3.3. Projekty pozakonkursowe (EFRR) – PLAN NA KOLEJNE LATA.....	27
6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) – KONKURSOWE.....	30
6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.....	30
6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.....	30
6.3. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONE DO KOŃCA 2018 ROKU DLA PROJEKTÓW EFS.....	32
7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF	34
8. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF	37
8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT	37
8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF	38
9. PLAN NAPRAWCZY	40
10. STOPNIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF	41
10.1 Wskaźniki produktu	41
10.2 Wskaźniki rezultatu w ramach Osi 6.....	43
10.3 Wskaźniki rezultatu w ramach Osi 8,9 i 10.....	45
11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING.....	46
11.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI.....	46
11.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU	47
12. PROJEKTY ZAKOŃCZONE.....	48
13. ORGANY WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA PROGRAMOWA ZIT KOF.....	50
14. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT.....	51
14.1.PODSTAWOWE ZADANIA IP ZIT.....	51
14.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT.....	52
14.2.1. WSPARCIE EKSPERCKIE W POSTACI DORADZTWA (PROJECT PIPELINE).....	52
14.2.2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE – PROMOCYJNE IP ZIT	53
14.2.3. GRUPY TEMATYCZNE	53
15. EWALUACJA SYSTEMU REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT.....	54
16. GŁÓWNE WYZWANIA I CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027	54
17. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	54

1. WPROWADZENIE

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (**Strategia ZIT KOF**) jest dokumentem strategicznym określającym cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Strategia obejmuje swoim zasięgiem miasto wojewódzkie Kielce i powiązany z nim obszar funkcjonalny.

Podstawą prawną Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. (z późniejszymi zmianami) określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego podpisane przez Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Górnó, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Gminę Piekoszków, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk. Strategia została zaopiniowana pozytywnie Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r.

Minister Rozwoju w dniu 22.03.2016 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT KOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych.

Strategia ZIT KOF podlegała procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT KOF została opracowana w czerwcu 2014 roku (aktualizacja lipiec 2015 r.) W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ na środowisko skutków, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zamierzeń Strategii.

W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR II/2018 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministra Rozwoju w dniu 15.06.2018 r.

Obowiązek opracowania przez Instytucję Pośredniczącą ZIT KOF **Raportu z realizacji Strategii ZIT KOF** wynika bezpośrednio z zapisów w Strategii.

- **I Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016**, opracowany został przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, BIURO ZIT i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR I/2017 z 20 czerwca 2017 r.
- **II Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2017**, opracowany został również przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, BIURO ZIT i zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego NR V/2018 z 21.06.2018 r.

Niniejszy Raport dotyczy działań wdrożeniowych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą na przestrzeni roku 2018.

2. KIELECKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) należy do mniejszych obszarów funkcjonalnych w kraju i składa się obecnie z 12 gmin. W roku 2018 liczba mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania KOF wynosiła 339 377 mieszkańców, co stanowi 27 % mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego. Szczegółowe dane zawiera tabela poniżej.


KOF tworzą: Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Miasto i Gmina Morawica Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Strawczyn oraz Gmina Zagnańsk.

Misją gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, działających w porozumieniu, jest współpraca w zakresie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, odpowiadającej na wyzwania społeczne, gospodarcze i przestrzenne dotyczące mieszkańców i przedsiębiorców obszaru funkcjonalnego. Głównym celem jest utrzymanie liczby mieszkańców KOF i przyciągnięcie nowych osób poprzez stałą poprawę jakości życia oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez stałą współpracę ze sferą nauki i gospodarki.

Kielecki Obszar Funkcjonalny - demografia, powierzchnia.

Gminy	Ludność (stan na 31.12.2018 r.)	Ogólne saldo migracji	Powierzchnia km ²
Chęciny	15 102,00	46,00	127,4
Chmielnik	11 320,00	-22,00	142,2
Daleszyce	15 855,00	66,00	222,4
Górno	14 375,00	5,00	83,2
Masłów	10 951,00	146,00	85,6
Miedziana Góra	11 488,00	73,00	71,1
Morawica	16 482,00	161,00	140,4
Piekoszów	16 476,00	11,00	103,0
Sitkówka-Nowiny	7 838,00	31,00	45,6
Strawczyn	10 735,00	53,00	86,3
Zagnańsk	12 981,00	-17,00	124,9
Kielce	195 774,00	-582,00	109,7
GMINY KOF	339 377,00 27% mieszkańców woj. świętokrzyskiego	-29,00	1 342 11,5 % powierzchni woj. świętokrzyskiego
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE	1 241 546,00	-2 452,00	11 711

Kielecki Obszar Funkcjonalny - liczba podmiotów gospodarczych w gminach KOF oraz ich udział w KOF (stan na dzień: 31.12.2017 r.)

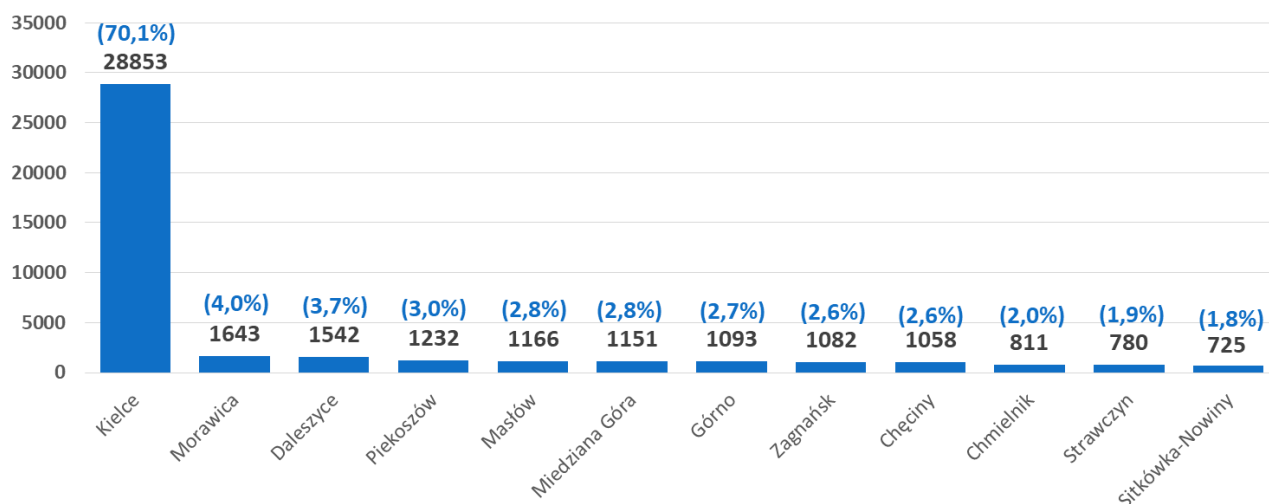

3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, każdemu z celów strategicznych są przyporządkowane priorytety strategiczne, w ramach których wyróżniono działania do wykonania.

Cel 1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Działania strategiczne planowane do realizacji w ramach celu strategicznego to m.in.:

- Promocja i wsparcie samozatrudnienia
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- Wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
- Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych

Cel 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego

- Rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwo drogowe
- Rozwój i integracja systemu komunikacji publicznej
- Poprawa ilości i jakości taboru autobusowego
- Budowa obwodnic Kielc

- Działania na rzecz zwiększenia dostępności zewnętrznej KOF, w tym w szczególności transportem samochodowym i lotniczym
- Wykorzystanie transportu kolejowego do poprawy połączeń między gminami KOF a Kielcami

Cel 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania.

- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i poprawa dostępu do nich we wszystkich gminach KOF
- Rozwój oferty edukacyjnej szkół na terenie KOF, w tym zajęć pozalekcyjnych
- Rozbudowa i wyposażenie placówek oświatowych
- Rozwój oferty kształcenia zawodowego dla branż obecnych na terenie KOF
- Edukacja na rzecz innowacyjności i promocja postaw innowacyjnych
- Wsparcie zmiany oferty edukacyjnej szkół zawodowych i średnich na dostosowaną do potrzeb rynku prac
- Stworzenie systemu szkoleń oraz przekwalifikowania dla mieszkańców KOF
- Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego
- Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
- Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Cel 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF.

- Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją
- Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej

Cel 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie
- Modernizacja oświetlenia ulicznego
- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej
- Uporządkowanie i rozwój systemu ścieżek rowerowych w KOF

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących osi i priorytetów inwestycyjnych *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020* :

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Oś 6 – Rozwój Miast

- PI 4c** Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
- PI 4e** Działanie 6.2. Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska
- PI 6d** Działanie 6.3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

PI 7b Działanie 6.4. Infrastruktura drogowa

PI 10a Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

PI 8iv Działanie 8.1. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

PI 8vi Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się

PI 10i Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

PI 10iii Działanie 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

PI 10iv Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

PI 9iv Działanie 9.2. Ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Oś 10 – Otwarty rynek pracy

PI 8i Działanie 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

PI 8iii Działanie 10.4. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

4. WDRAŻANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020

Stopień wdrożenia celów strategicznych badany jest poprzez monitoring strategiczny, który obejmuje kilka elementów:

- ❖ poziom wskaźników kontekstowych związanych z wizją rozwoju oraz realizacją celów strategicznych;
- ❖ stopień realizacji celów (wskaźniki rezultatu) i działań strategicznych (wskaźniki produktu);
- ❖ analizę porównawczą z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce w obszarach: gospodarka i rynek pracy, demografia i społeczeństwo, infrastruktura i środowisko;
- ❖ analizę przyszłych trendów rozwojowych takich jak zmieniające się wzorce pracy i zamieszkania ludności, nowe rozwiązania w zakresie polityki miejskiej i przestrzennej, nowe rozwiązania technologiczne usprawniające funkcjonowanie miast itp.

4.1 ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOŚW)

Tab. 1. ALOKACJA ŚRODKÓW DLA ZIT

FUNDUSZ	WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE [EURO]	UDZIAŁ ALOKACJI ZIT W CAŁKOWITEJ ALOKACJI ŚRODKÓW DLA RPOŚW*
EFRR	68 597 514,00	6,99%
EFS	13 800 000,00	3,60%
Razem EFRR + EFS	82 397 514,00	6,04%

* Całkowita kwota środków dla RPOŚW – **1 364 543 593,00** [EURO]

Poniższe tabele prezentują szczegółowy podział dofinansowania UE na poszczególne Osie priorytetowe, Poddziałania, Działania, Cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

TAB. NR 2. REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF - EFRR

Fundusz	Oś - nazwa	Działanie - kod	Alokacja ogółem (euro)	Podziałanie - kod	Podziałanie - nazwa	Cel Tematyczny	Priorytet Inwestycyjny	Priorytet Inwestycyjny - nazwa	Cel Tematyczny Strategii ZIT KOF
EFRR	Rozwój miast	6.1	13 637 709 14 039 372*	nd	nd	4	4c	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym	5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii
EFRR	Rozwój miast	6.2	11 592 859 11 392 027*	nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.2		nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.2		nd	nd	4	4e	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

EFRR	Rozwój miast	6.3	10 229 626	nd	nd	6	6d	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę	4.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF
EFRR	Rozwój miast	6.4	10 028 794*	nd	nd	6	6d	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę	4.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF
EFRR	Rozwój miast	6.4	25 906 807	nd	nd	7	7b	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
EFRR	Rozwój miast	6.6	7 230 513	nd	nd	10	10a	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania

Alokacja EFRR : 68 597 513 EURO

(*) W SZOOP (wersja 18) z września 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał przesunięcia alokacji dla ZIT pomiędzy działaniami 6.1, 6.2, 6.3.

Po zmianach alokacja dla działań wynosi:

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF” – 14 039 372 Euro,

6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska”– 11 392 027Euro,

6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”– 10 028 794 Euro,

co ujęto w powyższej tabeli.

TAB. NR 3. REALIZACJA CELÓW STRATEGII ZIT KOF – EFS

Fundusz	Oś - nazwa	Działanie - kod	Alokacja ogółem (euro)	Podziałanie - kod	Podziałanie - nazwa	Cel Tematyczny	Priorytet Inwestycyjny	Priorytet Inwestycyjny - nazwa	Cel Tematyczny Strategii ZIT KOF
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.1	200 000	8.1.2	Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT	8	8iv	Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.2	2 200 000	8.2.3	Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT	8	8vi	Aktywne i zdrowe starzenie się	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3	2 400 000	8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3		8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.3		8.3.6	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	10	10i	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.4	1 500 000	8.4.3	Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT	10	10iii	Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.5	1 500 000	8.5.4	Kształcenie ustawiczne – ZIT	10	10iv	Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

EFS	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	8.5		8.5.4	Kształcenie ustawiczne – ZIT	10	10iv	Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	9.2	800 000	9.2.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	9	9iv	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	9.2		9.2.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	9	9iv	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	3.Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej, w tym poprawa jakości nauczania
EFS	Otwarty rynek pracy	10.2	2 500 000	10.2.2	Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT	8	8i	Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
EFS	Otwarty rynek pracy	10.4	2 700 000	10.4.2	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT	8	8iii	Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

Alokacja EFS: 13 800 000 EURO

4.2. Ramy wykonania RPOWŚ 2014-2020


Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są w ramach Osi priorytetowej Nr 6.

TAB. NR 4. RAMY WYKONANIA OSI PRIORYTETOWEJ 6

Oś priorytetowa	Typ wskaźnika	Lp.	Wskaźnik lub KEW	Jednostka pomiaru	Fundusz	Kategoria regionu	Cel pośredni (2018)			Cel końcowy (2023)			Źródło danych	Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika	Kwota rezerwy wykonania, która zostanie ostatecznie alokowana w 2019 r.
							M	K	O	M	K	O			
Oś 6. Rozwój miast	Wskaźnik produktu	1.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	14	N/D	N/D	96	SL 2014	Wskaźniki produktu dotyczą odpowiednio priorytetu 9b 7b Definicja wskaźnika zgodna z definicją zawartą WLWK Wskaźniki w połączeniu obrazuje ponad 50% alokacji przeznaczony na oś priorytetową 6.	7 123 211,00 EUR
	Wskaźnik produktu	2.	Całkowita długość nowych dróg (C)	km	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	0	N/D	N/D	5			
	KEW	3.	Całkowita długość nowych dróg w podpisanych umowach	km	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	5	N/D	N/D	n/d			
	Wskaźnik finansowy	4.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	mln EUR	EFRR	Słabiej rozwinięty	N/D	N/D	16 470 588,00	N/D	N/D	139 570 830,00	SL 2014	N/D	

źródło: RPOWŚ na lata 2014-2020

RYS. NR 1. ALOKACJA ŚRODKÓW UE DLA OSI 6. ROZWÓJ MIAST – 139 570 830 EUR

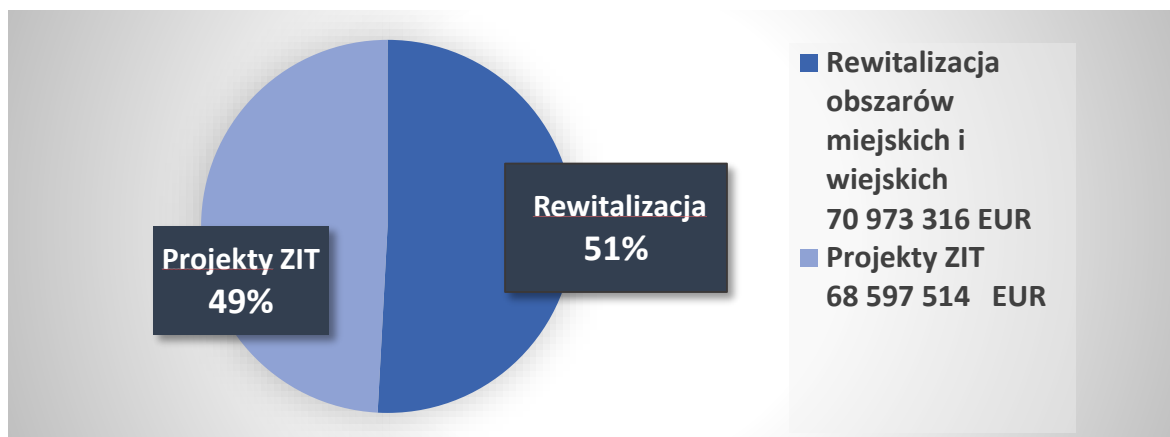


5. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - POZAKONKURSOWE

Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach instrumentu ZIT realizują łącznie 54 projekty pozakonkursowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty umieszczone są w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik NR 5 do SZOOP RPOWŚ oraz na Szczegółowej liście projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącej Załącznik NR 1 do *Strategii ZIT KOF*.

Listę projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na poszczególne priorytety inwestycyjne, obrazuje Tabela NR 5, natomiast poniższy wykres obrazuje rozkład alokacji środków UE na poszczególne działania.

RYS. NR 2 PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA –ALOKACJA ORAZ LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

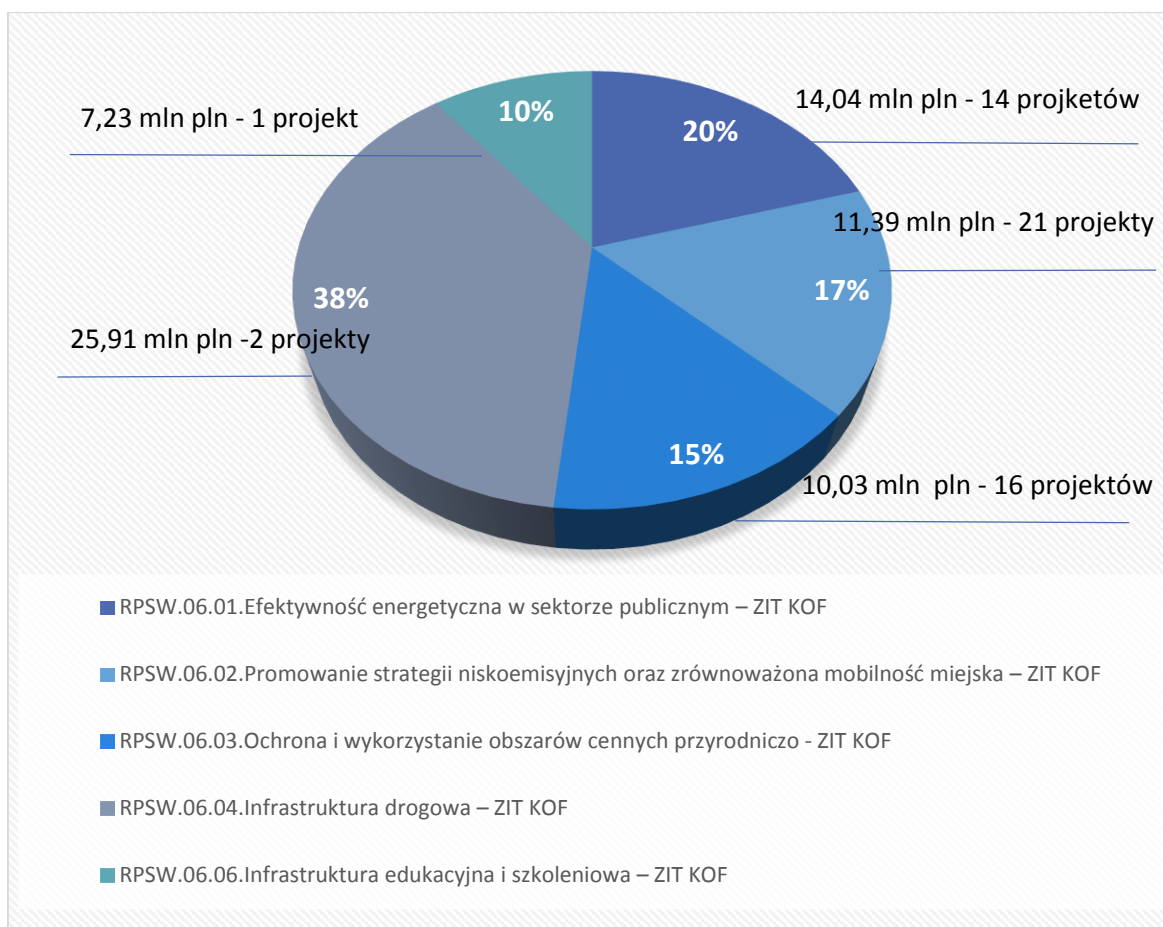

Alokacja EFRR dla działań ZIT wynosi 68 597 513 EU tj. 288 603 457 PLN (wg kursu 4,2072).

TAB. NR 5. SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (EFRR) (bez opisów projektów)

LP	Nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Termin realizacji projektu	Data podpisania pre-umowy	Aktualna wartość całkowita projektu mln pln	Aktualna wartość dofinansowania projektu ze środków UE mln pln	Data podpisania umowy o dofinansowanie
4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowy							
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT	Gmina Kielce	II kw. 2017 r.+ I kw. 2019 r.	03.06.2016 r.	14,5	7,11	26.06.2017 r.
2.	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny	Gmina Chęciny	IV kw.2015 r.+ IV kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	10,06	6,13	29.09.2017 r.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik	Gmina Chmielnik	II kw.2015 r.+ IV kw. 2017 r.	03.06.2016 r.	5,29	3,81	29.09.2017 r.
4.	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT	Gmina Daleszyce	I kw. 2017 r.+ I kw. 2019 r.	03.06.2016 r.	8,44	6,99	23.03.2017 r.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Górno	Gmina Górno	II kw. 2015 r.+ III kw. 2020r.	03.06.2016 r.	4,27	3,11	29.06.2017 r.
6.	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	IV kw. 2016 r.+ IV kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	4,26	3,09	23.03.2017 r.
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra	Gmina Miedziana Góra	III kw. 2016 r.+ II kw. 2020 r.	03.06.2016 r.	9,90	7,45	29.09.2017 r.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	Gmina Morawica	II kw. 2016 r.+ III kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	14,07	5,02	25.07.2017 r.
9.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	I kw. 2017 r.+ IV kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	2,33	1,66	12.10.2017 r.
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny	Gmina Sitkówka-Nowiny	IV kw. 2017 r.+ III kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	1,10	0,79	27.09.2017 r.
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	Gmina Zagnańsk	III kw. 2017 r.+ IV kw. 2018 r.	03.06.2016 r.	3,07	2,46	29.06.2017 r.
12.	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II	Gmina Chęciny	I kw. 2016 r.+ IV kw. 2020 r.	15.11.2018 r.	2,99	2,54	
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II	Gmina Chmielnik	II kw. 2018 r.+ IV kw. 2018 r.	15.11.2018 r.	1,80	1,53	

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

14	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)	Gmina Piekoszów	I kw. 2018 r.+ IV kw. 2020 r.	27.11.2018	6,18	5,25	
7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi							
15	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	Gmina Kielce	II kw. 2017 r.+ IV kw. 2018 r.	06.07.2016 r.	30,80	24,18	29.06.2017 r.
16	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	Gmina Kielce	IV kw. 2018 r.+ IV kw. 2020 r.	20.12.2016	121,1	84,105	31.10.2018 r.
10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
17	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	Gmina Kielce	I kw. 2016 r.+ I kw. 2019 r.	24.11.2016 r.	44,28	30,6	27.11.2017 r.
4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - modernizacja oświetlenia ulicznego							
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	Gmina Chęciny	IV kw. 2016 r. + II kw. 2018 r.	17.06.2016 r.	1,88	1,60	5.06.2017 r.
19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Gmina Chmielnik	I kw. 2016 r.+ III kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,49	2,12	14.03.2018 r.
20	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	I kw. 2017 r. + I kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,19	1,86	7.06.2017 r.
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	Gmina Górnio	III kw. 2015 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	3,61	2,58	22.06.2017 r.
22	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	Gmina Kielce	II kw. 2018 r.+ IV kw. 2018 r.	16.11.2016 r.	5,92	4,36	29.06.2018 r.
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	III kw. 2016 r.+ IV kw. 2017r.	17.06.2016 r.	2,33	1,98	18.04.2017 r.
24	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra	Gmina Miedziana Góra	III kw. 2016 r.+ II kw. 2020r.	17.06.2016 r.	2,79	1,73	22.09.2017 r.
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica	Gmina Morawica	II kw. 2016 r.+ III kw. 2018 r.	17.06.2016 r.	2,62	2,23	20.09.2017 r.
26	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	I kw. 2017 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	4,12	3,39	27.07.2018 r.
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny	Gmina Sitkówka-Nowiny	II kw. 2017 r.+ II kw. 2018 r.	17.06.2016 r.	1,34	1,10	22.06.2017 r.
28	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn.	Gmina Strawczyn	III kw. 2016 r.+ I kw. 2018 r.	17.06.2016 r.	4,64	3,94	16.11.2017 r.
29	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	I kw. 2017 r.+ IV kw. 2018 r.	05.07.2016 r.	0,40	0,34	5.06.2017 r.
4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa ścieżek rowerowych							
30	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny	Gmina Chęciny	I kw. 2019 r.+ IV kw. 2020 r.	07.11.2016	0,7	0,59	
31	Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	III kw. 2018 r.+ III kw. 2020 r.	17.11.2016.	0,9445	0,799	
32	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	Gmina Górnio	IV kw. 2015 r.+ I kw. 2020 r.	16.11.2016 r.	1,52	1,29	11.07.2018 r.

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

33	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	Gmina Kielce	III kw. 2016 r.+ IV kw. 2020 r.	16.11.2016 r.	10,2	8,68	29.06.2018 r.
34	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	Gmina Masłów	II kw. 2017 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,91	1,57	29.12.2017 r.
35	Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów	Gmina Piekoszów	II kw. 2017 r.+ III kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,14	1,82	27.12.2017 r.
36	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.	Gmina Sitkówka-Nowiny	I kw. 2018 r.+ IV kw. 2018 r.	16.11.2016 r.	1,92	1,31	20.03.2018 r.
37	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	II kw. 2017 r.+ I kw. 2020 r.	05.07.2016 r.	3,54	3,01	25.09.2017 r.
4e.Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zrównoważona mobilność miejska budowa centrów przesiadkowych							
38	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego	Gmina Daleszyce	III kw.2018 r. + IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	1,45	1,23	
6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury - możliwe sfinansowanie projektów obejmujących działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją np. zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne							
39	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Gmina Chęciny	IV kw. 2016 r.+ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,77	1,74	
40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Gmina Chmielnik	I kw. 2019 r.+ II kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,64	2,24	
41	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widelki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	IV kw. 2017 r.+ I kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	0,68	0,58	28.12.2017 r.
42	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio	Gmina Górnio	IV kw. 2015 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	1,68	1,43	23.06.2017 r.
43	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Gmina Górnio	II kw. 2015 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,72	1,48	27.09.2017 r.
44	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	Gmina Masłów	II kw. 2018 r.+ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	2,71	2,20	05.12.2018 r.
45	Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	Gmina Morawica	III kw. 2017 r.+ IV kw. 2018 r.	17.06.2016 r.	8,21	4,85	12.10.2017 r.
46	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie gminy Piekoszów	Gmina Piekoszów	IV kw. 2016 r.+ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	1,70	1,44	
47	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.	Gmina Sitkówka-Nowiny	III kw. 2019 r.+ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	0,58	0,49	29.06.2018 r.
48	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	Gmina Strawczyn	IV kw. 2018 r.+ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,95	2,5075	
49	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn –ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa	Gmina Strawczyn	II kw. 2020 r.+ IV kw. 2022 r.	17.06.2016 r.	2,67	2,27	
50	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk	Gmina Zagnańsk	IV kw. 2018 r.+ II kw. 2020 r.	05.07.2016 r.	2,26	1,92	31.12.2018 r.

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Alokacja wynikająca z ZIT w ramach RPOWŚ - możliwe sfinansowanie projektów z zakresu: rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. Parki krajobrazowe, rezerwy przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz prowadzenie działań/kampanii informacyjno - edukacyjnych							
51	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce	Gmina Kielce	III kw. 2017 r.+ IV kw. 2019 r.	16.11.2016	13,94	11,85	14.03.2018 r.
52	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Gmina Chęciny	III kw.2017 r.+ II kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	0,2	0,17	
53	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	IV kw. 2017 r.+ I kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	1,84	1,23	28.12.2017 r.
54	Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku”	Gmina Zagnańsk	I kw. 2018 r.+ III kw. 2019 r.	05.07.2016 r.	3,68	3,13	
SUMA					395,35	282,89	mln pln

5.1. ZMIANY NA „SZCZEGÓŁOWEJ LIŚCIE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH REALIZOWANYCH W FORMULE ZIT W TRYBIE POZAKONKURSOWYM” STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ZIT KOF

Uchwałą NR III/2018 z dnia 23.03.2018 roku Komitetu Sterującego ZIT KOF zaopiniowano „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 - aktualizacja marzec 2018”. Zaktualizowany dokument zawiera m.in. zmiany do „Szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym”. Do Listy dodano następujące projekty:

- 1) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II;
- 2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II;
- 3) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszków (etap II).

5.2. ZMIANY ZGŁOSZONE PRZEZ IP ZIT DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wszystkie zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgłoszone do IZ obrazuje poniższa tabela.

TAB. NR 6. ZMIANY ZGŁOSZONE W 2017 I 2018 ROKU DO RPOWŚ NA LATA 2014-2020

LP	ZAKRES ZMIANY	ISTNIEJĄCY ZAPIS	PROPONOWANA ZMIANA
1	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)	51 173 056 (KWh/rok)	14 918 550,64* (KWh/rok)
2	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	15 szt.	41 szt.
3	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4.c. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym	13 637 709,00 EUR	14 039 372,36* EUR
4	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 4e. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące dla zmiany klimatu	11 592 859,00 EUR	11 392 027,32* EUR
5	Zmiana wielkości wsparcia UE dla Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, priorytetu inwestycyjnego 6d. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	10 229 626,00 EUR	10 028 794,32* EUR
6	Zmiana wskaźnika KEW pn.: Całkowita długość nowych dróg, na wskaźnik pn.: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	Całkowita długość nowych dróg – rok 2018: 0 km, rok 2023: 5 km	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – rok 2018: 8 szt., rok 2023: 41 szt.
7	Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn.: Całkowita długość nowych dróg (CI)	5 km	4,5 km
8	Dodanie do „Szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym” trzech dodatkowych projektów: a) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II; b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II; c) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)	Ilość projektów - 51	Ilość projektów – 54 (Tab. NR 5)

(*) zmiany zgłoszone w 2017 roku

Wszystkie zmiany do RPOWŚ 2014-2020, zgłoszone do IZ, zostały uwzględnione i wprowadzone do SzOOP RPOWŚ (wersja 18) z września 2018 r.

5.3. PROJEKTY POZAKONKURSOWE (EFRR) – REALIZACJA

5.3.1 Umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR , podpisane w 2018 roku

W 2018 roku podpisano w sumie 11 umów na projekty realizowane w ramach EFRR, na łączną kwotę 121 721 401,50 PLN. Poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej .

TAB. NR 7. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z EFRR , PODPISANE W 2018 ROKU

Poddziałanie - kod	Lp	Tytuł projektu	Beneficjent	Data podpisania umowy pierwotnej	Wartość ogółem	Wkład UE PLN
6.1.	1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	2018-03-20	1 921 254,91	1 310 000,00
	2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	GMINA CHMIELNIK	2018-03-14	2 668 418,02	2 116 199,95
	3	„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów”	GMINA PIEKOSZÓW	2018-07-27	4 123 366,86	3 394 087,70
	4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	GMINA GÓRNO	2018-07-11	1 522 802,35	1 294 382,00
	5	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	GMINA KIELCE	2018-06-29	5 916 546,72	4 360 500,00
	6	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	GMINA KIELCE	2018-06-29	10 208 470,59	8 677 200,00
6.2.	7	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce	GMINA KIELCE	2018-03-14	13 940 000,00	11 849 000,00
	8	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	2018-06-29	578 814,00	491 991,90
	9	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	GMINA MASŁÓW	2018-12-05	2 707 202,56	2 200 848,00

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

	10	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk	GMINA ZAGNAŃSK	2018-12-31	2 260 849,41	1 921 722,00
6.4.	11	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	GMINA KIELCE	2018-10-31	121 100 000,00	84 105 469,95

SUMA 121 721 401,50

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 41 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 257,45 mln PLN (w tym umowa Gminy Zagnańsk zawarta w dn.31.12.2018 r. - nie widoczna w systemie SL na kwotę 1,92 mln PLN), co stanowi 89 % całkowitej alokacji w ramach EFRR. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje poniższa tabela.


TAB. NR 8. PROJEKTY POZAKONKURSOWE WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR – PROCENTOWE WYKORZYSTANIE ALOKACJI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁANIA (WG STANU NA 31.12.2018 R)

DZIAŁANIE - KOD	NAZWA DZIAŁANIA	ILOŚĆ PROJEKTÓW	ILOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH	WARTOŚĆ OGÓŁEM PLN	WKŁAD UE PLN	ALOKACJA PLN (WG KURSU 4,2072)	% WYKORZYSTANIA ALOKACJI
RPSW.06.01.	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	11	2	77 560 238,37	47 623 772,57	59 066 445,88	81%
RPSW.06.02.	Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF	18	5	56 756 937,51	44 917 872,01	4 7928 535,99	94%
RPSW.06.03.	Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF	9	0	34 614 523,69	26 022 417,32	42 193 142,12	62%
RPSW.06.04.	Infrastruktura drogowa – ZIT KOF	2	0	151 897 969,10	108 286 534,52	10 899 5118,4	99%
RPSW.06.06.	Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF	1	0	44 280 000,00	30 600 000,00	30 420 214,29	101%
SUMA		41	7	365 109 668,67	257 450 596,42	288 603 456,70	89%

5.3.2. Wnioski o płatność złożone do końca 2018 roku, dla projektów EFRR

Na koniec 2018 roku beneficjenci złożyli wnioski o płatność dla projektów realizowanych w ramach EFRR na łączną kwotę 69,63 mln PLN, co stanowi 24,13% alokacji.

RYS. NR 3 . STOPIEŃ REALIZACJI ALOKACJI DLA EFRR – KONTRAKTACJA, WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, CERTYFIKACJA

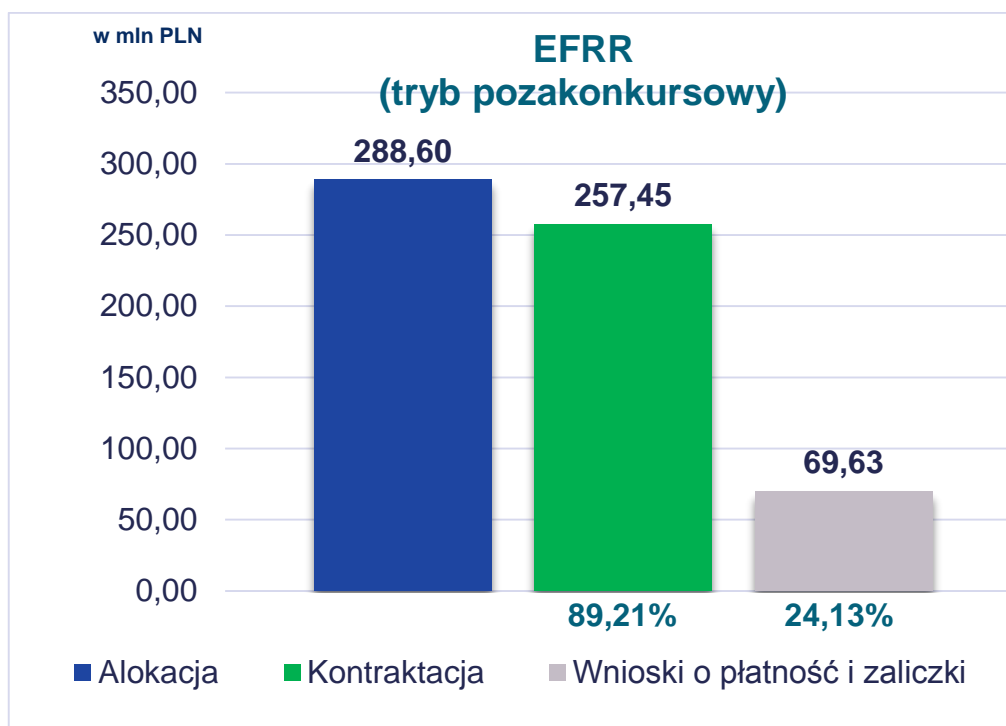

5.3.3. Projekty pozakonkursowe (EFRR) – PLAN NA KOLEJNE LATA

TAB. NR 9. HARMONOGRAM KONTRAKTACJI PROJEKTÓW EFRR – CAŁA PERSPEKTYWA

LP	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Termin realizacji projektu	Data podpisania pre-umowy	Aktualna wartość całkowita projektu mln pIn	Aktualna wartość dofinansowania projektu ze środków UE mln pIn
I KW.2019 – 0 umów						
II KW. 2019						
1	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Gmina Chęciny	IV kw. 2016 r.÷ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,04	1,74
2	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	Gmina Strawczyn	IV kw. 2018 r.÷ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,95	2,33
3	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie gminy Piekoszów	Gmina Piekoszów	IV kw. 2016 r.÷ IV kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	1,7	1,44
III KW. 2019						
4	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Etap II	Gmina Chęciny	I kw. 2016 r.÷ IV kw. 2020 r.	15.11.2018 r.	2,99	2,54
5	Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Daleszyce	Gmina Daleszyce	III kw. 2018 r.÷ III kw. 2020 r.	17.11.2016.	0,94	0,8
6	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego	Gmina Daleszyce	III kw.2018 r. ÷ IV kw. 2019 r.	17.06.2016 r.	1,45	1,23
IV KW. 2019						

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Etap II	Gmina Chmielnik	II kw. 2018 r.÷ IV kw. 2018 r.	15.11.2018 r.	1,8	1,53
8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.	Gmina Chmielnik	I kw. 2019 r.÷ II kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	2,64	2,24
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów (etap II)	Gmina Piekoszów	I kw. 2018 r.÷ IV kw. 2020 r.	27.11.2018	6,18	5,25
I KW. 2020						
10	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	Gmina Chęciny	III kw.2017 r.÷ II kw. 2020 r.	17.06.2016 r.	0,2	0,17
11	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny	Gmina Chęciny	I kw. 2019 r.÷ IV kw. 2020 r.	07.11.2016	0,7	0,59
12	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn –ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa	Gmina Strawczyn	II kw. 2020 r.÷ IV kw. 2022 r.	17.06.2016 r.	2,67	2,27
13	Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku”	Gmina Zagnańsk	I kw. 2018 r.÷ III kw. 2019 r.	05.07.2016 r.	3,68	3,13

SUMA 23,82
mln pln

TAB. NR 10. HARMONOGRAM KONTRAKTACJI PROJEKTÓW EFS I EFRR – PLAN 2019 ROKU

KWARTAŁ	I KWARTAŁ 2019		II KWARTAŁ 2019		III KWARTAŁ 2019		IV KWARTAŁ 2019	
	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR
Liczba umów (narastająco)	52 szt.	41 szt.	-	44 szt.	-	47 szt.	-	50 szt.
Wartość umów (narastająco) mln PLN	50,37	252,61	52,22	258,12	57,51	262,69	60,06	271,71
% wykorzystania alokacji	84,82%	85,58%	87,94%	87,45%	96,85%	89,00%	101,15%	92,06%
Ogólna wartość umów (narastająco) mln PLN	302,97	mln pln	310,34	mln pln	320,2	mln pln	331,77	mln pln
Ogólny % wykorzystania alokacji	85,45%		87,53%		90,31%		93,58%	
Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MliR wg Planu Naprawczego	84,98%		87,04%		91,28%		93,06	
Stopień realizacji celu MliR	100,55%		100,56%		98,94%		100,56%	

6. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS) – KONKURSOWE

6.1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS odbywały się 2018 roku wg Harmonogramu naborów wniosków przyjętego Uchwałą NR 1991/2016 z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów, wszystkie w ramach 8 Osi priorytetowej RPOWŚ 2014 – 2020.

Konkursy dotyczyły następujących poddziałań:

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów EFS w ramach następujących poddziałań:

- 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZI,
- 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej,
- 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT,
- 8.5.4 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU – ZIT.

6.2. UMOWY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W 2018 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakontraktowano środki w wysokości 9 588 380,60 PLN w 21 podpisanych umowach (w tym 14 umów, w ramach konkursów ogłoszonych w 2017 roku).

Tab. NR 11 Umowy o dofinansowanie podpisane w 2018 r. w ramach EFS

OŚ - kod	Oś nazwa	Poddziałanie - kod	Poddziałanie nazwa	Ilość zawartych umów	Wkład UE PLN
Oś 8	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	RPSW.08.01.02	Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT	1	1 128 567,84
		RPSW.08.03.06	Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT	5	1 391 326,44

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

		RPSW.08.04.03	Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT	12	5 767 364,75
		RPSW.08.05.04	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU - ZIT	3	1 301 121,57
			Σ	21	9 588 380,60

Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 52 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 50,37 mln PLN co stanowi 86,75 % całkowitej alokacji w ramach EFS. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje poniższa tabela.

Tab. NR 12. Projekty konkursowe współfinansowane z EFS – procentowe wykorzystanie alokacji z podziałem na Poddziałania (wg stanu na 31.12.2018 r.)

PODDZIAŁANIE - KOD	NAZWA PODDZIAŁANIA	ILOŚĆ PROJEKTÓW	ILOŚĆ PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH	WARTOŚĆ OGÓLEM	WKŁAD UE	ALOKACJA PLN WG KURSU 4,2072	% WYKORZYSTANIA ALOKACJI
RPSW.08.01.02	Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3-ZIT	3	1	2 191 812,84	1 779 876	841 440	212%
RPSW.08.02.03	Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT	3	0	5762843,7	4 898 417	9 255 840	53%
RPSW.08.03.06	Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT	14	3	9 044 905,07	7 649 108	10 097 280	76%
RPSW.08.04.03	Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT	12	0	6 785 135,00	5 767 365	6 310 800	91%
RPSW.08.05.04	Kształcenie ustawiczne – ZIT	4	0	2 022 443,75	1 719 077	6 310 800	27%

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020


RPSW.09.02.02	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	4	1	1 960 439,60	1 666 373	3 365 760	50%
RPSW.10.02.02	Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT	9	3	15 869 021,29	12 709 364	10 518 000	121%
RPSW.10.04.02	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych - ZIT	3	0	16 677 670,80	14 176 020	11 359 440	125%
SUMA		52	8	60 314 272,05	50 365 601	58 059 360	87%

6. 3. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONE DO KOŃCA 2018 ROKU DLA PROJEKTÓW EFS

Do końca 2018 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 30,75 mln PLN, co stanowi **50,12 % alokacji EFS** – dla poszczególnych poddziałań, tj.:

- 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” – 0,27 mln PLN,
- 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej” – 2,74 mln PLN,
- 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej” – 4,40 mln PLN,
- 8.4.3 „Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych” – 0,20 mln PLN,
- 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne” – 0,20 mln PLN,
- 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” – 0,89 mln PLN,
- 10.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” – 9,57 mln PLN,
- 10.4.2 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych” – 12,45 mln PLN.

RYS NR 4. STOPIEŃ REALIZACJI ALOKACJI DLA EFS

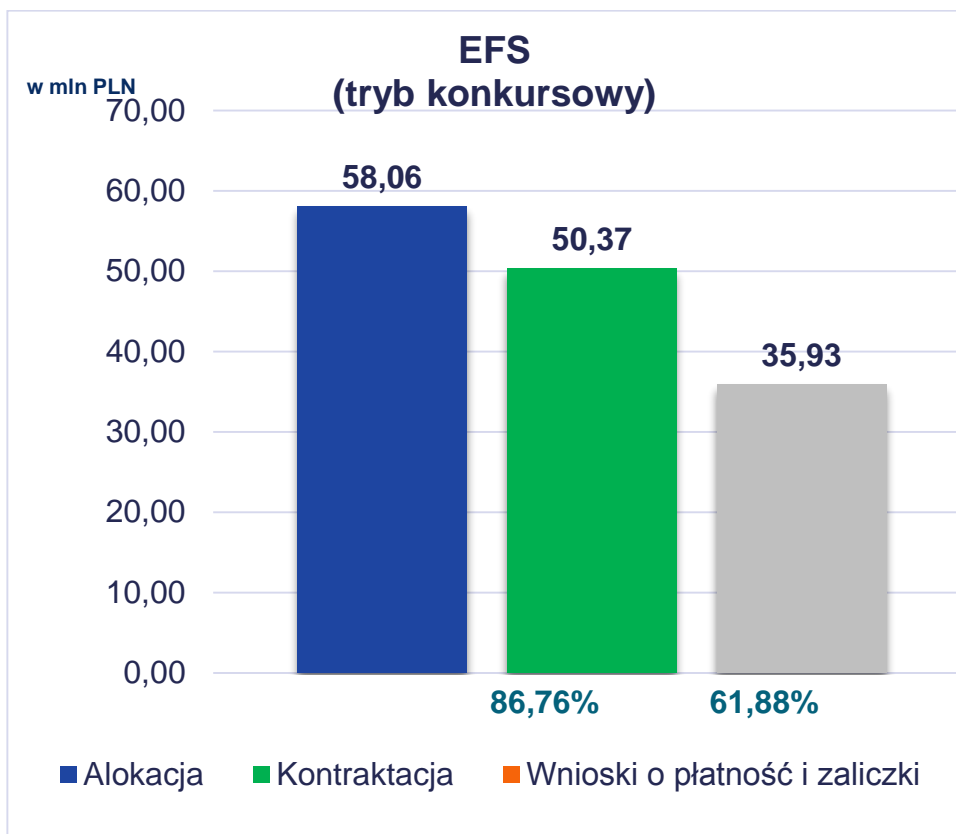

7. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.5) oraz EFS (Rozdz.6), stopień wykorzystania alokacji dla ZIT KOF do dnia 31.12.2018 r., w podpisanych umowach o dofinansowanie, wyniósł 88,80 %. Porównując tę wartość z założeniami przyjętymi do Planu Naprawczego (78,64%), IP ZIT KOF dotrzymała zawartych w Planie zobowiązań, przewyższając przyjęty przez Ministerstwo procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o 10 punktów procentowych. W odniesieniu do stopnia wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność, należy zwrócić uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania alokacji. Szczegółowo obrazują to poniższe tabele.

TAB. NR 13.A STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF WG PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE, WG STANU NA 31.12.2018 R.

KWARTAŁ	I KWARTAŁ 2018		II KWARTAŁ 2018		III KWARTAŁ 2018		IV KWARTAŁ 2018	
	FUNDUSZ	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS
Liczba umów (narastająco)	32 szt.	33 szt.	43 szt.	36 szt.	51 szt.	38 szt.	52 szt.	41 szt.
Wartość umów (narastająco) mln PLN	41,21	149,4	46,38	163,18	50,29	168,53	50,37	257,45
% wykorzystania alokacji	70,97%	51,77%	79,88%	56,54%	86,61%	58,40%	86,75%	89,21%
Ogólna wartość umów (narastająco) mln PLN	190,61		209,56		218,82		307,82	
Ogólny % wykorzystania alokacji	54,98%		60,45%		63,12%		88,80%	
Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MliR wg Planu naprawczego	53,73%		62,95%		70,88%		78,64%	
Stopień realizacji celu MliR	102,33%		96,03%		89,05%		112,92%	

TAB. NR 13.B. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI DLA ZIT KOF WG WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ, WG STANU NA 31.12.2018 R.

KWARTAŁ	I KWARTAŁ 2018		II KWARTAŁ 2018		III KWARTAŁ 2018		IV KWARTAŁ 2018	
FUNDUSZ	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR	EFS	EFRR
Wartość wniosków (narastająco) mln PLN	12,09	8,09	17,94	26,39	28,11	39,22	33,80	59,31
% wykorzystania alokacji	20,83%	2,80%	30,90%	9,14%	48,42%	13,59%	58,22%	20,55%
Ogólna wartość wniosków (narastająco) mln PLN	20,18		44,33		67,34		93,11	
Ogólny % wykorzystania alokacji	5,82%		12,79%		19,43%		26,86%	
Minimalny % wykorzystania alokacji akceptowalny przez MliR wg Planu naprawczego	4,43%		7,35%		14,05%		25,38%	
Stopień realizacji celu MliR	131,38%		174,01%		138,29%		105,83%	

Wg kursu euro 4,2072

8 . PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT ORAZ WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

8.1. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ POROZUMIENIE ZIT

W *Strategii ZIT KOF* umieszczone są projekty komplementarne zidentyfikowane przez Porozumienie ZIT przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e. *Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.* Lista projektów stanowi Załącznik NR 2 do Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020. Stan realizacji tych projektów przedstawia poniższa tabela. Na koniec 2018 roku zatwierdzono wnioski o płatność wysokości łącznej 83,53 mln PLN, co stanowi 33 % alokacji środków na te zadania.


TAB. NR 14 A PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

LP	Tytuł projektu	Beneficjent	Tryb	Termin realizacji projektu	Wartość całkowita projektu PLN	Dofinansowanie UE PLN	Data podpisania umowy o dofinansowanie
<i>4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu</i>							
1	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach	Gmina Kielce	pozakonkursowy	2017-2019	104 110 399,46	79 143 952,38	14.06.2017
2	Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach	Gmina Kielce	pozakonkursowy	2016-2020*	233 470 002,57 (**)	172 617 054,71	14.06.2017
					337 580 402,03	251 761 007,09	

(*) w dniu publikacja Raportu: 2016-2022 r.

(**) w dniu publikacji Raportu 246 541 626,96

RYS. NR 5. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE – WYKORZYSTANIE ALOKACJI STAN NA 31.12.2018 R.

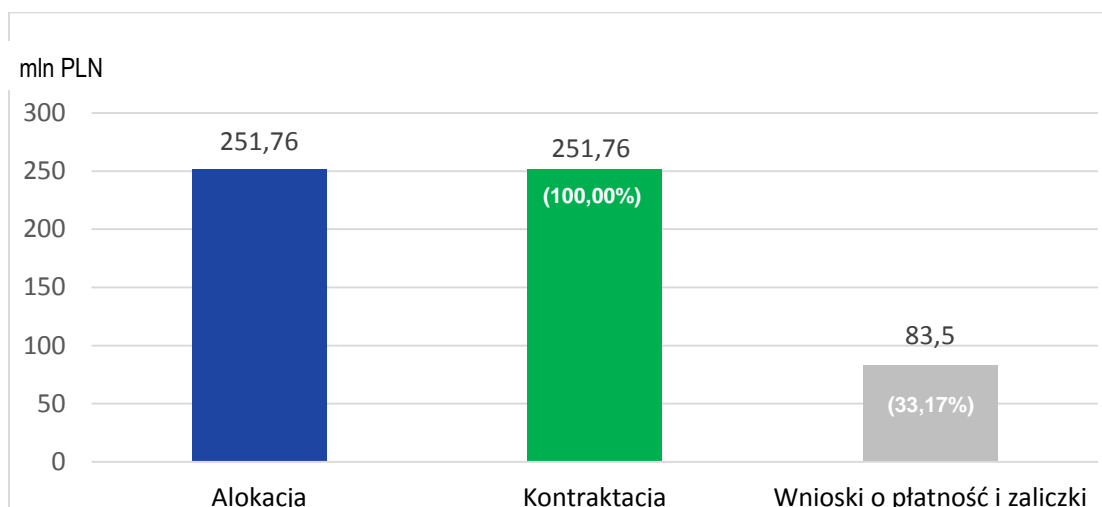

8.2. PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

Poza projektami komplementarnymi, w Strategię ZIT KOF wpisują się projekty konkursowe realizowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących priorytetów inwestycyjnych:

- PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi;
- PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Możliwość realizacji tych działań jest uwarunkowana od rozstrzygnięć konkursów ogłaszanych w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. Projekty przedstawia poniższa tabela.

Do 31.12.2017 r., z wymienionych w tabeli 12 projektów podpisano umowy dla 5 projektów. W 2018 roku nie podpisywano nowych umów. Podpisano jedynie aneksy zmieniające kwoty, co uwzględniono w zestawieniu.

TAB. NR 14 B PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZIT KOF

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020						
Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Szacunkowa wartość całkowita/wg umowy /mln PLN/	Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych/wg umowy/mln PLN/	Szacunkowa kwota dofinansowania/wg umowy /mln PLN/	Data podpisania umowy
PI 7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi						
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 764 na odcinku od DK 73 do granicy Miasta Kielce	Gmina Kielce	86,30	76,90	65,37	
2.	Rozbudowa DK 74 w Kielcach w ciągu ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej	Gmina Kielce	40,00	37,30	31,70	
3.	Przebudowa i rozbudowa DK 73 w Kielcach w ciągu ul. Radomskiej, na odcinku od granicy miasta do ul. Jaworskiego	Gmina Kielce	202,50	188,80	160,48	
4.	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy miasta do Węzła Drogowego Kielce-Zachód na połączeniu DK 74 z S7	Gmina Kielce	110,00	105,20	89,42	
5.	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Województwo Świętokrzyskie	141,53	129,42	110,00	15.09.2017
6.	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Województwo Świętokrzyskie	68,77	57,92	49,23	28.02.2017
7.	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	Województwo Świętokrzyskie	27,00	27,00	22,95	-
8.	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73	Województwo Świętokrzyskie	47,02	41,35	35,15	28.02.2017
9.	Budowa nowego przebiegu DW763 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – projektowany węzeł na DK73	Województwo Świętokrzyskie	112,00	112,00	95,20	-
10.	Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów - Mąchocice	Województwo Świętokrzyskie	71,00	71,00	60,35	-
11.	Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów-węzeł Jaworznia (S7)	Województwo Świętokrzyskie	9,34	9,32	7,92	28.06.2016
PI 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości						
1.	Platforma startowa Kieleckiego Parku Technologicznego	Kielecki Park Technologiczny	3,82	3,82	3,25	23.03.2016

9. PLAN NAPRAWCZY

W celu przyspieszenia absorpcji środków finansowych Unii Europejskiej Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w odpowiedzi na oczekiwania Ministerstwa Rozwoju, opracowała w grudniu 2016 r. wspólnie z IP WUP i Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 **Plan Naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim wraz z załącznikami m.in. Planem działań Porozumienia ZIT KOF** (Plan Naprawczy).

Prezentowane poniżej tabele pokazują minimalne, akceptowalne przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poziomy kontraktacji i realizacji wniosków o płatność wg Planu naprawczego oraz stopień realizacji osiągnięty przez Porozumienie ZIT KOF, w poszczególnych kwartałach 2018 roku.

Tab. NR 15. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI WG KONTRAKTACJI.

	I KWARTAŁ 2018	II KWARTAŁ 2018	III KWARTAŁ 2018	IV KWARTAŁ 2018
MINIMALNY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI AKCEPTOWALNY PRZEZ MIIR	53,73%	62,95%	70,88%	78,64%
OSIĄGNIĘTY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI	54,98%	60,45%	63,12%	88,80%
STOPIEŃ REALIZACJI CELU MIIR	102,33%	96,03%	89,05%	112,92%

Wg kursu euro 4,2072

Tab. NR 16. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI WG WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ.

	I KWARTAŁ 2018	II KWARTAŁ 2018	III KWARTAŁ 2018	IV KWARTAŁ 2018
MINIMALNY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI AKCEPTOWALNY PRZEZ MIIR	4,43%	7,35%	14,05%	25,38%
OSIĄGNIĘTY % WYKORZYSTANIA ALOKACJI	5,82%	12,79%	19,43%	26,86%
STOPIEŃ REALIZACJI CELU MIIR	131,38%	174,01%	138,29%	105,83%

Wg kursu euro 4,2072

W odniesieniu do stopnia wykorzystania alokacji wg kontraktacji, należy zwrócić uwagę, iż w II i III kwartale 2018 roku nie dotrzymano w 100 % założonych w Planie naprawczym celów. Było to spowodowane przesunięciami terminów podpisania umów dla projektów pozakonkursowych. Jednak na koniec 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania alokacji.

W odniesieniu do stopnia wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność, należy zwrócić uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania alokacji.

10. STOPNIENIE REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU PRZYJĘTYCH W STRATEGII ZIT KOF

Miarą osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w Strategii ZIT KOF jest realizacja wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.

Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanego środków. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu.

Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania projektu oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu informują o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki te są przedstawiane na etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Stąd podlegają badaniu po zakończeniu realizacji projektów.

10.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU

Lista wskaźników produktu przyjętych do zrealizowania w ramach Strategii ZIT KOF znajduje się w Załączniku NR 5 do Strategii ZIT KOF. Lista wskaźników rezultatu, znajduje się w Załączniku NR 6 do Strategii ZIT KOF. Informacje nt. stopnia realizacji zakładanych wskaźników pozyskiwane są przez IP ZIT za pośrednictwem systemu SL2014.

TAB. NR 15 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU, UJĘTYCH W RAMACH WYKONANIA RPOWŚ NA LATA 2014-2020

LP	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość pośrednia - 2018	Wartość docelowa - 2023	Stan na dzień 31.12.2018r.
1	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	km	8	41	28 / 68%
2	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoby	-	20	58 / 290%
3	Liczba uczniów objętych wsparciem w programie	osoby	-	2121	1869 / 88%

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

4	Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	-	437	342 / 78%
5	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	osoby	-	409	514 / 125%
6	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoby	-	1206	726 / 97%

Tabela poniżej obrazuje realizację pozostałych wskaźników produktu ujętych w Strategii ZIT KOF.

TAB. NR 16 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ZIT

Oś - kod	Działanie/Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wielkość wskaźnika w Strategii ZIT KOF	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procent realizacji wskaźnika
Oś 6	06.01.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt	41	28	68%
	06.01.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2]	2827	0	0%
	06.01.00	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych **	[kWh/rok]	14 918 550,64	0	0%
	06.02.00	Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego	szt	6100	5632	92%
	06.02.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2]	5490	0	0%
	06.02.00	Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	34	0	0%
	06.03.00	Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	10	0	0%
	06.04.00	Długość przebudowanych dróg wojewódzkich	km	2,0	0	0%
	06.04.00	Całkowita długość nowych dróg	km	4,5	0	0%
	06.06.00	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej /Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt	1	0	0%
Oś 8	08.01.02	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	os	20	58	290%
	08.01.02	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	os	22	56	255%
	08.02.03	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	os	11 232	105 03	94%
	08.03.06	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	os	409	514	126%
	08.03.06	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt	123	336	273%
	08.03.06	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	os	2121	1869	88%
	08.03.06	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	os	294	95	32%
	08.03.06	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	os	12	14	117%
	08.04.03	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	1009	235	23,3%
	08.04.03	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os	1009	414	41%

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

	08.04.03	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	3364	527	16%
	08.05.04	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	os	295	43	15%
	08.05.04	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	os	23	10	43%
	08.05.04	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	os	112	0	0%
	08.05.04	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	os	5	0	0%
	08.05.04	Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie	os	1	0	0%
Os 9	09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os	437	342	78%
	09.02.03	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	os	50	0	0%
Os 10	10.02.02	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	os	743	726	98%
	10.02.02	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	os	188	388	206%
	10.02.02	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	os	103	180	175%
	10.02.02	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os	28	35	125%
	10.02.02	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	os	81	337	416%
	10.02.02	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os	220	449	204%
	10.02.02	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	podlega monitorowaniu	2	-
	10.04.02	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	137	313	228%
	10.04.02	Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os	25	56	224%

10.2 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 6.

- **Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowanych na obszarze KOF**, monitorowany w ramach Celu 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego - dane pozyskiwane są od Komendy Wojewódzka Policji w Kielcach, Tab. NR 17;
- **Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10 na obszarze KOF**, w ramach Celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii – dane na podstawie Obliczeń własnych oraz na podstawie danych z WIOŚ, Tab. NR 20;
- **Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej w obszarze wchodzącym w skład KOF [GJ]**, w ramach celu 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii i – dane pozyskiwane z Banku Danych Lokalnych. Tab. NR 18;
- **Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF**, w ramach Celu 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF – dane pozyskiwane z GUS; Tab. NR 19.

TAB. NR 17 WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH ODNOTOWANYCH NA OBSZARZE KOF

LP	Gmina KOF	Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Chęciny	2	4	3	6	5
2	Chmielnik	1	4	1	2	1
3	Daleszyce	2	2	1	3	0
4	Górno	5	4	4	4	5
5	Masłów	0	1	1	0	1
6	Miedziana Góra	3	2	0	4	5
7	Morawica	4	5	1	2	1
8	Piekoszów	2	2	0	1	1
9	Sitkówka-Nowiny	0	0	0	0	0
10	Strawczyn	1	4	0	0	2
11	Zagnańsk	4	3	1	4	1
12	Kielce	3	10	6	5	3
	Σ	27	41	18	31	25

TAB. NR 18 WSKAŹNIK REZULTATU: SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ W CIĄGU ROKU W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ [GJ]

Obszar *	Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku w budynkach użyteczności publicznej [GJ]			
	2015	2016	2017	2018
POWIAT KIELECKI I MIASTO KIELCE	364 119	367 893	405 605	Dane będą dostępne w listopadzie 2019 r

* Dane na niższym szczeblu niż powiat nie są dostępne ze względu na obowiązującą tajemnicę statystyczną (art. 38 ustawy o statystyce publicznej)

TAB. NR 19 WSKAŹNIK REZULTATU: STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH NA OBSZARZE KOF

LP	Gmina KOF	Stoپیeń wykorzystania miejsc noclegowych na obszarze KOF			
		2015	2016	2017	2018
1	Chęciny	25,0	22,1	26,2 %	26,0%
2	Chmielnik	bd	bd		
3	Daleszyce	17,0	22,6		
4	Górno	21,4	16,9		
5	Masłów	32,1	33,1		
6	Miedziana Góra	8,6	10,9		
7	Morawica	bd	bd		
8	Piekoszów	9,5	10,0		
9	Sitkówka-Nowiny	24,3	26,6		
10	Strawczyn	6,4	21,0		
11	Zagnańsk	11,0	12,3		
12	Kielce	25,4	29,4		

TAB. NR 20 WSKAŹNIK REZULTATU: LICZBA DNI W CIĄGU ROKU, W KTÓRYCH ODNOTOWANO DOBOWE PRZEKROCZENIA EMISJI PYŁU PM 10 NA OBSZARZE KOF

LP	Lokalizacja stacji Państwowego Monitoringu Środowiska	Liczba dni w ciągu roku, w których odnotowano dobowe przekroczenia emisji pyłu PM 10				
		2014*	2015*	2016**	2017***	2018****
1	Kielce ul. Jagiellońska	68	66	45	62	bd
2	Kielce ul. Kusocińskiego	47	45	33	41	41
3	Nowiny, ul. Parkowa	69	80	57	71	80

* Dane z WIOŚ Kielce

** Dane na podstawie informacji zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2016 - <http://kielce.pios.gov.pl/raporty/raporty.htm>

*** Dane na podstawie informacji zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2017 - http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2018/roczna.pdf

**** Dane na podstawie informacji zawartych w Ocenie jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2018 http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/or_jak_pow/2019/roczna.pdf

10.3 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 8,9 I 10

Realizacja wskaźników rezultatu w ramach Osi priorytetowych NR 8, 9 i 10 zobrazowana jest w poniższej tabeli.

TAB. NR. 21 WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH OSI 8,9 I 10

Oś priorytetowa - kod	Poddziałanie - kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Oś 8	RPSW.08.01.02	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	os	1	45%	90%
	RPSW.08.01.02	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	os	9	45%	90%
	RPSW.08.02.03	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	os	2049	nd	15 952
	RPSW.08.03.06	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	os	4	74%	80
	RPSW.08.03.06	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	os	1	podlega monitorowaniu	podlega monitorowaniu
	RPSW.08.03.06	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	os	1	97%	97%

III RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ZIT KOF NA LATA 2014 -2020

	RPSW.08.03.06	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]	os	5	100%	90%
	RPSW.08.05.04	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	os	18	74%	80%
Oś 9	RPSW.09.02.02	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	os	0	47%	23%
	RPSW.09.02.02	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	os	30	90%	90%
oś 10	RPSW.10.02.02	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os	432	39%	39%
	RPSW.10.02.02	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	os	190	51%	51%
	RPSW.10.02.02	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	os	378	nd	192

11. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING

Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami strukturalnymi, dostarczają informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.

Zgodnie z art. 50 *Rozporządzenia ogólnego*, IZ RPOWŚ – Departament Polityki Regionalnej zbiera i opracowuje roczne oraz końcowe sprawozdanie z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 w poprzednim roku budżetowym i po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący przedkłada w wyznaczonym prawodawstwem terminie do Komisji Europejskiej.

Dane odnoszące się do wskaźników wykonania są zapisywane i przechowywane w systemie elektronicznym IZ RPOWŚ.

IP ZIT przygotowują wybrane dane do informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych w trybie informacyjnym, polegającym na podaniu danych ilościowych w formie tabelarycznej oraz jakościowych w formie opisowej zgodnie z instrukcją przygotowania sprawozdania rocznego/końcowego przygotowaną przez Instytucję do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (IK UP).

11.1. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPOWŚ 2014-2020, w zakresie zadań powierzonych IP RPO WŚ 2014-2020

Institucja Pośrednicząca w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, IP ZIT sporządza sprawozdania roczne i końcowe z wdrażania programu w poprzednim roku budżetowym. IP sporządza sprawozdania z zakresu zadań powierzonych IP przez IZ RPO WŚ 2014-2020.

Sprawozdania zawierają kluczowe informacje nt. wdrażania programu i jego priorytetów w szczególności danych finansowych (w zakresie zadań powierzonych IP wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych oraz wartości docelowych ujętych ilościowo). Przedstawiają również syntezę wyników wszystkich ewaluacji programu, a także inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu oraz podjęte działania. Sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji RPO WŚ 2014-2020, w zakresie zadań powierzonych IP ZIT na podstawie danych z SL2014 zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014 w tym narzędzie Oracle wg wytycznych opracowanych przez IZDPR.

Sprawozdania roczne i końcowe przekazywane są przez IP ZIT do IZ RPO WŚ 2014-2020 w formie elektronicznej wraz ze skanem pisma informującego o przekazaniu sprawozdania. Całościowe sprawozdania opracowane przez IZ RPO WŚ są przekazywane przez IZ RPO WŚ do KE za pomocą systemu SFC 2014.

Institucja Pośrednicząca ZIT realizowała prawidłowo swoje obowiązki w zakresie monitoringu i sprawozdawczości. Sprawozdanie Roczne za 2018 r. – przekazano do IZ (DPR) w dniu 29.03.2019 r.

11.2. OBOWIĄZKI IP ZIT W ZAKRESIE MONITORINGU

Do zadań IP ZIT w zakresie monitoringu należy:

- Monitorowanie poziomu realizacji wskaźników dotyczących powierzonych i realizowanych zadań w ramach RPO WŚ.
- Przygotowanie i przekazywanie wszelkich informacji w zakresie monitoringu powierzonych zadań na żądanie, w formie i terminie wskazanym IZ DW EFRR.
- Przekazywanie we wskazanym terminie do IZ RPO WŚ oraz IZ DW EFRR i IZ wszelkich dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadań.
- Monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i niezwłoczne informowanie IZ DW EFRR o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji, jednocześnie przedkładając plan naprawczy.
- Monitorowanie wskaźników realizacji Strategii ZIT, analiza realizacji celów strategicznych.
- Analiza porównawcza KOF z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce.

RAPORT Z MONITOROWANIA STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

PI ZIT realizowała w 2017 roku swoje zadania z zakresu monitoringu prawidłowo. Raport z zmonitorowania stanu przygotowania projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przygotowywany jest zgodnie z załącznikiem NR EFRR.VI.1. do Instrukcji wykonawczej IZ i przekazywany, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, do IZ (DW EFRR)

Złożone do IZ (DW EFRR) Sprawozdania w tym zakresie:

- **Raport za I kw. 2018 r.** – przekazano do IZ w dniu 12.04.2018 r.
- **Raport za II kw. 2018 r.** – przekazano do IZ w dniu 13.07.2018 r.
- **Raport za III kw. 2018 r.** – przekazano do IZ w dniu 10.10.2018 r.
- **Raport za IV kw. 2018 r.** – przekazano do IZ w dniu 11.01.2019 r.

MONITOROWANIE STANU PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

▪ **Sprawozdania kwartalne z przygotowania projektów pozakonkursowych przedkładane przez beneficjentów.**

Beneficjenci (gminy KOF) przekazywali do IP ZIT, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, Sprawozdania kwartalne. Wzór sprawozdania stanowił załącznik do każdej preumowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a Instytucja Zarządzająca.

Sprawozdania odzwierciedlają stan bieżący i postęp przygotowania projektów pozakonkursowych. Sprawozdania obejmują stan przygotowania dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

▪ **Formularze miesięczne (w ramach wewnętrznego monitoringu) z postępu finansowego realizacji projektów pozakonkursowych.**

Beneficjenci przekazywali do IP ZIT Formularze, do 5 dnia każdego miesiąca. Formularze zawierają szczegółowe dane nt. postępu finansowego realizacji projektów, stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Informacje zawarte w Sprawozdaniach oraz Formularzach podlegają analizie i stanowią podstawą do wprowadzania działań naprawczych. Formularze od 2018 roku są składane do IP ZIT za pośrednictwem Portalu ZIT KOF, o którym mowa w Rozdziale 14 niniejszego Raportu.

▪ **Spotkania monitorujące stan przygotowania projektów pozakonkursowych.**

W ramach wzmocnienia współpracy i monitoringu projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT, od stycznia do grudnia 2018 r. w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbywały się raz w miesiącu cykliczne spotkania robocze z koordynatorami ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Główne tematy spotkań. Celem spotkań jest bieżąca wymiana informacji na temat stanu zaawansowania prac przy realizacji poszczególnych inwestycji, wymiana poglądów, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów. Na spotkaniach omawiane są, oprócz zagadnień związanych z projektami pozakonkursowymi, inne zagadnienia związane z wdrażaniem Strategii ZIT KOF.

MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII ZIT

Zadanie omówione w Rozdziale 11 niniejszego Raportu

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOF Z INNYMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI W POLSCE.

Analiza została opracowana w czerwcu 2018 roku. Dokument jest dostępny na Portalu ZIT KOF.

12. PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Do końca 2018 roku (wg Raportu SL2014 z dnia 02.01.2019 r.) zostało zakończonych 7 projektów, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota dofinansowania środkami Unii dla tych projektów to 13 566 654,24 PLN. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończono realizację 8 projektów - kwota dofinansowania środkami Unii: 3 794 020,69 PLN.

Tab. NR. 22 PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFRR – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2018 R.

Działanie - kod	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość ogółem pln	Wkład UE pln
RPSW.06.01.00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik	GMINA CHMIELNIK	5 286 198,64	3 807 333,52
RPSW.06.01.00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	1 102 059,09	793 034,27
RPSW.06.02.00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	GMINA MASŁÓW	2 333 504,29	1 983 478,65
RPSW.06.02.00	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	GMINA ZAGNAŃSK	398 636,41	338 840,93
RPSW.06.02.00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	GMINA CHĘCINY	1 878 502,20	1 596 726,87
RPSW.06.02.00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	1 341 465,16	1 103 240,00
RPSW.06.02.00	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn	GMINA STRAWCZYN	4 640 000,00	3 944 000,00
SUMA			16 980 365,79	13 566 654,24

Tab. NR. 23 PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z EFS – ZREALIZOWANE DO KOŃCA 2018 R.

Działanie - kod	Tytuł projektu	Beneficjent wiodący	Wartość ogółem	Wkład UE
RPSW.08.01.00	Żłobek bajka - przyjazne miejsce dla Twojego malucha	BAJKA PAULINA BILSKA	85 407,50	72 595,50
RPSW.08.03.00	Wesołe przedszkolaki	GMINA MORAWICA/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY	688 911,03	585 591,03
RPSW.08.03.00	"Przedszkole dla wszystkich"	MARZENA JUSZCZAK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "FLOWER"/ PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAJKOWA KRAINA	322 796,63	273 967,45
RPSW.08.03.00	Naukowe Przedszkole w Kielcach	FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA PULS	375 516,66	317 981,66
RPSW.09.02.00	Integracja-Edukacja-Sukces	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	345 425,85	293 611,97
RPSW.10.02.00	Pracuję dzięki kwalifikacjom	BCO BIURO DORADZTWA BIZNESOWEGO A. NOWAK, M. BORYTA - BOROWIECKA SP.J.	1 224 144,00	1 040 522,40
RPSW.10.02.00	Mam pracę!	PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	454 059,00	385 950,15
RPSW.10.02.00	Praca-Kariera-Sukces	FUNDACJA CHALLENGE EUROPE	969 177,10	823 800,53
SUMA			4 465 437,77	3 794 020,69

13. ORGANY WSPIERAJĄCE IP ZIT - KOMITET STERUJĄCY I RADA PROGRAMOWA ZIT KOF

Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli wszystkich jst wchodzących w skład Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.:

- opiniowanie Strategii ZIT KOF,
- opiniowanie zmian w załącznikach do Strategii ZIT KOF dotyczących listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT oraz listy projektów komplementarnych,
- opiniowanie kryteriów wyboru projektów do ZIT KOF,
- opiniowanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach ZIT KOF,
- opiniowanie innych dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii ZIT KOF wymaganych przez IZ RPOWŚ.

Rada Programowa składa się z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, gospodarczych i biznesowych, oraz przedstawicieli Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Rady Programowej należy m.in.:

- opiniowanie projektów dokumentów stanowiących podstawę do podejmowania decyzji merytorycznych przez KS,
- opiniowanie kryteriów wyboru projektów,
- konsultacje dokumentów strategicznych wypracowanych w ramach ZIT.

Posiedzenia Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF odbyte w 2017 roku:

- 1) 07.02.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 2) 23.03.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 3) 30.05.2018 r. (Sitkówka-Nowiny) - wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 4) 21.06.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 5) 18.09.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 6) 17.10.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 7) 04.12.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF,
- 8) 17.12.2018 r.- wspólne Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF.

Protokoły z posiedzeń organów wspierających ZIT KOF zawierają szczegółowe informacje nt. uczestników posiedzeń, zaproszonych gości, podejmowanych uchwał, podejmowanych dyskusji, przedstawianych prezentacji itp.

Uchwały Komitetu Sterującego ZIT KOF podjęte w 2018 roku:

- Uchwała NR I/2018 z dnia 10.01.2018 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanych „Kryteriów oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF,
- Uchwała NR II/2018 z dnia 26.01.2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 - aktualizacja styczeń 2018”,

- Uchwała NR III/2018 z dnia 23.03.2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 - aktualizacja marzec 2018”,
- Uchwała NR IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO,
- Uchwała NR V/2018 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „II Raport z realizacji Strategii ZIT KOF na lata 2014 - 2020” za rok 2017.

14. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH IP ZIT

14.1. PODSTAWOWE ZADANIA IP ZIT

Realizacja zadań powierzonych IP ZIT odbywa się na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020”, zawartego w dniu 29 czerwca 2015 r, zmienionego Aneksami NR 1 z dnia 26.01.2016 r., Aneksami Nr 2 z dnia 19.12.2017 r., Aneksami Nr 3 z dnia 15.11.2018 r. (kolejny Aneks Nr 4 dotyczy roku 2019).

Do zadań IP ZIT należy m.in:

1.1. OPRACOWANIE I PRZEDŁOŻENIE ZAOPINIOWANEJ PRZEZ KS ZIT KOF STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO NA LATA 2014-2020, DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ RPOWŚ I WŁAŚCIWE MINISTERSTWA.

Proces ten został szczegółowo opisany w „I Raporcie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za okres 2015-2016”.

1.2. AKTUALIZOWANIE STRATEGII ZIT KOF W TRYBIE ZAOPINIOWANIA PRZEZ KS ZIT KOF I PRZEDŁOŻENIE DO IZ RPOWŚ.

Strategia ZIT KOF w roku 2018 podlegała aktualizacji .

IP ZIT przy piśmie znak:ZFE-II.042.4.2.2018 z 16.04.2018 r przekazała do IZ celem opinii ustawowej Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 – aktualizacja marzec 2018 r.

1.3. OPRACOWANIE KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT DOTYCZĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM I POZAKONKURSOWYM W FORMULE ZIT ORAZ PRZEDSTAWIENIE DO AKCEPTACJI PRZEZ IZ RPOWŚ DO ZATWIERDZENIA KOMITETOWI MONITORUJĄCEMU RPOWŚ 2014-2020.

Kryteria oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS ze Strategią ZIT KOF są aktualizowane w miarę zachodzących potrzeb – ostatnia aktualizacja została przyjęta przez Komitet Monitorujący RPO WŚ na lata 2014 – 2020 uchwałą nr 129/2018 r. z dnia 20.02.2018 r.

1.4. WSPÓŁPRACA IZ RPOWŚ W PRZYGOTOWANIU HARMONOGRAMÓW NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z OBSZARU ZIT KOF.

IP ZIT uczestniczyła w opracowaniu Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2019. Harmonogram został przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

1.5. UDZIAŁ W OCENIE WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI OCENY PROJEKTÓW PRACOWNIKÓW IP ZIT I/LUB WSKAZANYCH PRZEZ NIĄ EKSPERTÓW W ZAKRESIE WERYFIKACJI PROJEKTÓW POD KATEM ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT KOF.

Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach EFS

W roku 2018 ogłoszono 6 konkursów EFS w ramach następujących Poddziałów:

- 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT,
- 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej,
- 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT,
- 8.5.4 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU – ZIT.

W ramach w/w konkursów pracownicy IP ZIT ocenili 15 wniosków. Od początku uruchomienia konkursów do końca 2018 r. pracownicy IP ZIT ocenili 182 wnioski o dofinansowanie projektów EFS.

Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach EFRR

Do końca roku 2018 pracownicy IP ZIT przeprowadzili ocenę 41 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF.

Udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT KOF.

W roku 2018 do IP ZIT wpłynął 1 protest dotyczący oceny zgodności ze Strategią ZIT - ocena części merytorycznej A.

1.6. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT W RAMACH RPOWŚ.

Informacje w tym zakresie przedstawiono w Rozdziale 11 niniejszego Raportu.

Szczegółowe sprawozdania roczne z realizacji opisanych wyżej zadań przedkładane są corocznie do Ministerstwa Rozwoju .

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT potwierdzona została kontrolą systemową przeprowadzoną przez IZ RPOWŚ w dniach 20÷29 czerwca 2018 roku. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, które miałyby wpływ na realizację zadań IP.

14.2. INNE DZIAŁANIA IP ZIT SŁUŻĄCE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT

14.2.1. WSPARCIE EKSPERCKIE W POSTACI DORADZTWA (PROJECT PIPELINE)

W roku 2018 blisko 119 osób, beneficjentów projektów ZIT skorzystało z bezpłatnego doradztwa organizowanego przez Biuro ZIT. W ramach doradztwa pipeline w roku 2018 zorganizowano bezpłatne doradztwo w następujących obszarach tematycznych:

- stosowanie RODO w projektach unijnych;
- księgowość projektów unijnych;
- kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych.

Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną. Łącznie od początku realizacji bezpłatnego doradztwa zorganizowano 15 spotkań doradczych, z których skorzystało 187 osób.

14.2.2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE – PROMOCYJNE IP ZIT

Portale i serwisy internetowe

Na potrzeby realizacji zadań IP ZIT, wszelkie informacje o działaniach poświęconych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym zamieszczane były w aktualnościach na stronie um.kielce.pl. Została specjalnie utworzona podstrona dedykowana Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego <http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/> oraz aktualizacja prowadzonych na niej zakładerek.

Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W sierpniu 2017 r. rozpoczęto pracę nad rozbudową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Portal ZIT KOF).

Portal funkcjonuje od początku 2018 roku i jest narzędziem służącym do gromadzenia i zarządzania informacjami o realizowanych projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. System stanowi innowacyjne rozwiązanie wspomagające i automatyzujące pracę Biura ZIT oraz Koordynatorów Gminnych ZIT w następujących kluczowych obszarach:

- **Rejestracja** (inwentaryzacja) – narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
- **Monitorowanie** (analiza) – narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie i analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie postępu projektów.
- **Sprawozdawczość** (raportowanie) – narzędzia informatyczne i procedury wspomagające generowanie niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.
- **Komunikacja społeczna** (konsultacje społeczne) – narzędzia informatyczne i procedury umożliwiające realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych na interaktywną komunikację ze społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.
- **Działania informacyjno-promocyjne** – narzędzia informatyczne i procedury zapewniające publikację istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności, przetargi, inne), także z wykorzystaniem danych przestrzennych.

Duży wpływ na monitoring realizowanych projektów mają sprawozdania z realizacji projektów składane przez Koordynatorów gminnych ZIT, które od II kwartału 2018 r. składane są do Biura ZIT poprzez Portal ZIT KOF. Na koniec roku 2018 zanotowano 4535 odwiedzin.

14.2.3. GRUPY TEMATYCZNE

Uchwała NR IV/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO, w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF powołano 4 grupy tematyczne: ds. polityki senioralnej, ds. przedsiębiorczości, ds. ochrony środowiska i ds. turystyki.

Do zadań grup tematycznych należy:

- Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
- Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
- Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
- Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
- Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej

W ramach tej grupy tematycznej odbyły się trzy spotkania.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej uczestniczyła w zorganizowaniu i realizacji Pierwszej Konferencji szkoleniowej Kieleckiej Rady Seniorów, która odbyła się w dniu 1.08.2018 r.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem polityki senioralnej dla KOF w kontekście budowania smart KOF-u w roku 2019. W ramach tej grupy tematycznej odbyły się trzy spotkania.

Grupa tematyczna ds. przedsiębiorczości

W ramach tej grupy tematycznej odbyło się jedno spotkanie w 2018 r. Zaproszeni goście, wśród których byli przedsiębiorcy oraz urzędnicy z gmin ościennych KOF podjęli inicjatywę dotyczącą m.in. wymiany doświadczeń w zakresie procesu pozyskiwania inwestorów, rozwijania bazy terenów inwestycyjnych, promocji eksportu w ramach KOF.

Grupa tematyczna ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

W ramach tej grupy odbyły się dwa spotkania.

W trakcie spotkań dyskutowano nt. możliwości realizacji projektów z zakresu przywrócenia bioróżnorodności biologicznej, ochrony powietrza, walki ze smogiem. Przedstawiono Plan Elektromobilności dla Polski oraz Plan adaptacji do zmian klimatu.

Grupa tematyczna ds. turystyki do końca roku 2018 nie odbyła posiedzenia, ze względu na konieczność rozważenia czy jej działania nie zostaną włączone do grupy tematycznej przedsiębiorczość.

15. EWALUACJA SYSTEMU REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT

Raport dotyczący realizacji narzędzia ZIT w Polsce, w perspektywie finansowej 2014-2020, opracowany został w czerwcu 2018 roku, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie miało na celu również ocenę efektów oraz sposobu wdrażania instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne podmioty zaangażowane w jego realizację.

Badanie dostarczyło szereg wniosków dotyczących funkcjonowania systemu realizacji instrumentu ZIT. Wśród najważniejszych należy wymienić pozytywne działanie instrumentu w zakresie uaktywnienia szeregu relacji pomiędzy partnerami Związków ZIT (sąsiednimi JST w obszarach funkcjonalnych), które dotychczas nie zachodziły. Należą do nich m.in. pogłębienie integracji, zbudowanie zaufania między

partnerami, ograniczenie zbędnej rywalizacji i konkurencji, definiowanie i próby rozwiązywania wspólnych problemów oraz zniwelowanie obaw odnośnie całkowicie dominującej pozycji miast-rdzeni. Warto podkreślić jest też zwiększenie efektywności podejmowania decyzji we wdrażaniu Polityki Spójności, ponieważ do ustalenia wspólnego stanowiska wymagany był dialog partnerów, a to pozwalało na wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Trwały charakter partnerstwa opartego przypisano ok. połowie Związków, w których zwykle związany jest on z istnieniem wcześniejszych tradycji współpracy. Na podstawie tych wniosków sformułowano pierwszą rekomendację strategiczną wynikającą z badania, **zakładającą kontynuowanie zewnętrznego wsparcia obszarów funkcjonalnych**, w celu utrwalania uzyskanych efektów realizacji instrumentu ZIT oraz m.in. zagwarantowanie poparcia władz centralnych dla idei zarządzania metropolitalnego. Za pozytywny wpływ instrumentu ZIT uznano także efekty w zakresie koordynacji Polityki Spójności, który jednak ogranicza się do projektów w ramach alokacji ZIT.

Dalsze wnioski wskazują konieczność rozszerzania zakresu zadań IP ZIT związanych z wdrażaniem projektów. Jest to zdeterminowane pozytywnym wpływem wykonywania funkcji IP na realizację instrumentu jaki zdiagnozowano w badaniu wraz z szerszym zakresem wykonywanych obowiązków. Uzasadnieniem dla tej rekomendacji jest także budowanie potencjału instytucjonalnego biur Związków ZIT, które będzie stwarzało możliwości dla bardziej efektywnego przewodzenia partnerstwom.

Za najtrafniejsze tematyczne obszary wsparcia uznano te, w których konieczne jest współdziałanie lub możliwy jest efekt synergii –dotyczy to zwłaszcza transportu publicznego, jakości środowiska naturalnego oraz ponadlokalnych usług publicznych.

Cały Raport zamieszczony jest pod adresem: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/59155/RK_ewaluacja_ZIT.pdf

16. GŁÓWNE WYZWANIA I CELE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027

„Dzisiaj proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów, która nie pozostawia nikogo w tyle. Zapewniliśmy, że jest bardziej elastyczna, aby dostosować ją do nowych priorytetów i lepiej chronić naszych obywateli.

Uprościliśmy również przepisy, co przyniesie korzyści wszystkim, od małych firm i przedsiębiorców po szkoły i szpitale, które będą miały łatwiejszy dostęp do funduszy”

Corina Crețu, komisarz ds. Polityki Regionalnej 29 maja 2018 r.

Pięć głównych celów przyświecających inwestycjom UE w latach 2021–2027:

1. Inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza).
2. Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (w tym transformacja sektora energetycznego, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem).
3. Lepiej połączona Europa (mobilność i łączność TIK).
4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (europejski filar praw socjalnych).
5. Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz inicjatywy lokalne).

Budżet UE na lata 2012-2027

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości **1,279 biliona euro**. Proponowana alokacja dla Polski: **64,39 mld EUR** (w cenach z 2018 r.)

Obszary/działania, które nie będą mogły otrzymywać wsparcia:

- EFRR - m.in. bezpośrednie wsparcie na rzecz dużych przedsiębiorstw, infrastruktura portów lotniczych (poza regionami najbardziej oddalonymi), niektóre rodzaje gospodarowania odpadami (np. składowanie odpadów), zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego (z wyjątkiem realizacji obowiązku świadczenia usługi publicznej);
- EFS - zakup gruntów i nieruchomości oraz zapewnienie infrastruktury, a także zakup mebli, wyposażenia i pojazdów, z wyjątkiem przypadków zakupu niezbędnego do osiągnięcia celu operacji.

Podstawowym dokumentem planistycznym dla Polski jest przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017r. **Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)**. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. To dokument planistyczny nowej generacji – wyraźnie identyfikujący głównego beneficjenta polityki rozwoju. SOR zakłada, że przyszły i obecny rozwój musi odbywać się w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny (uwzględniając terytorialne zróżnicowania i potrzeby). Opracowanie zarówno SOR jak i pozostałych strategii poprzedziły prace analityczne. Doprowadziły one do zidentyfikowania głównych wyznań rozwojowych.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) to dokument uszczegóławiający cele strategiczne SOR w obszarze rozwoju regionalnego. KSRR określa ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów jak i wewnątrz nich. Założeniem KSRR jest terytorializacja interwencji publicznej.

Wybrane wyzwania rozwojowe dla Polski wg SOR i KSRR (wybrane):

- Negatywne skutki procesów demograficznych (silnie odczuwalne na poziomie lokalnym)
- Rozwój infrastruktury wspierającej konkurencyjność na poziomie regionalnym i lokalnym
- Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (zróżnicowany potencjał prorozwojowy JST)
- Zmniejszenie nierówności terytorialnych i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych (np. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze).

Wyzwania rozwojowe wg KE

Wyzwania rozwojowe Polski identyfikuje także KE w ramach procesu Semestru Europejskiego (Country Report 2019):

- Polska gospodarka rozwija się na solidnych fundamentach – w 2018 r. wzrost wyniósł 5,1% (wobec 3,8% w 2016 r i 4,8% w 2017 r.),
- KE prognozuje wzrost PKB w 2019 r. na 3,5%, chociaż prognozy rynkowe wskazują na ponad 4% (Santander – 4%, PKO BP – 4,1%, PIE – 4,3%),
- Polski eksport jest zdwersyfikowany, a jego wartość jednostkowa (dobra kapitałowe) rośnie szybciej niż w krajach V4,
- Głównymi motorami wzrostu pozostają konsumpcja prywatna oraz wzrastające inwestycje (głównie publiczne, wspierane przez środki UE),
- Brak wyraźnych zagrożeń dla stabilności finansów publicznych, chociaż wyzwania są po stronie wydatkowej (system emerytalny i zdrowotny),
- Najniższy deficyt budżetowy zanotowany w okresie od początku transformacji społeczno-gospodarczej,

- Niższy niż w krajach regionu poziom inwestycji (prywatnych). Ale prognozy pokazują trend wzrostowy na lata 2019-2020 (Automn EconFor 2018).

Polska uznaje wskazane przez KE priorytety inwestycyjne jako dobry punkt wyjścia do dalszej debaty (...) chociaż zbyt „ogólne” jak dla potrzeb kraju, a zwłaszcza niewystarczająco uwzględniające zróżnicowanie potencjałów Regionów.

Wybrane wyzwania rozwojowe wg KE (Priorytety inwestycyjne wg Aneksu D)

- Transformacja krajowej gospodarki celem produkcji zaawansowanych produktów i usług (Gospodarka Oparta na Wiedzy),
- Zwiększenie inwestycji wspierających innowacje, edukację oraz rozwój umiejętności umożliwiających długoterminowy rozwój,
- Unowocześnienie infrastruktury i „zazielenienie” energetyki dla stworzenia podstaw dla zrównoważonego rozwoju,
- Przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa, które ma wpływ horyzontalny na procesy społeczne, gospodarcze oraz na poziomie budżetu,
- Zmniejszenie luki kompetencyjnej niezbędnej do wdrożenia „Przemysłu 4.0”,
- „Klimat inwestycyjny” – prawo, instytucje.

Opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

17. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą NR I/2016 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 17.02.2016 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NR 1209/15 z dnia 24.02.2016 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju w dniu 22.03.2016 r.

W marcu 2018 roku opracowano aktualizację Strategii ZIT KOF, która została przyjęta Uchwałą NR II/2018 Komitetu Sterującego ZIT KOF z dnia 26.01.2018 roku, pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministra Rozwoju w dniu 15.06.2018r.

W latach 2016-2018 prowadzone były intensywne działania związane z wdrażaniem narzędzia ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rok 2016 zaowocował podpisaniem przez beneficjentów 5 umów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania środkami UE 1 906 409,14 PLN. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gminy KOF podpisały 51 pre-umów dla wszystkich zidentyfikowanych projektów. Wykorzystanie alokacji środków EU w 2016 roku wyniosło 0,55%.

W roku 2017 Porozumienie ZIT KOF realizowało zapisy Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KOF. Obowiązek opracowania planów naprawczych narzucony został przez Ministerstwo Rozwoju

i dotyczył wszystkich IZ RPO, dla których wartość podpisanych umów o dofinansowanie, na listopad 2016 r., była mniejsza niż 19 % alokacji dedykowanej ZIT.

W 2018 roku **w ramach EFRR** podpisano w sumie 11 umów, na łączną kwotę 121,72 mln PLN, co stanowi 42,5 % alokacji na EFRR. Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 41 umów o dofinansowanie (EFRR) na łączną kwotę 257,45 mln PLN (w tym umowa Gminy Zagnańsk zawarta w dn.31.12.2018r. - nie widoczna w systemie SL na kwotę 1,92 mln PLN), co stanowi 89 % całkowitej alokacji w ramach EFRR. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje tabela NR 8. Na koniec 2018 roku beneficjenci złożyli wnioski o płatność dla projektów realizowanych w ramach EFRR na łączną kwotę 69,63 mln PLN, co stanowi 24,13% alokacji.

W 2018 roku **w ramach EFS** zakontraktowano środki w wysokości 9,59 mln PLN w 21 podpisanych umowach, co stanowi 16,5 % alokacji na EFS. Od początku wdrażania instrumentu ZIT do 31.12. 2018 r. zawarto w sumie 52 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 50,37 mln PLN co stanowi 86,75 % całkowitej alokacji w ramach EFS. Szczegółowy obraz wykorzystania alokacji, od początku wdrażania instrumentu ZIT, w poszczególnych działaniach, obrazuje tabela NR 12. Do końca 2018r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 30,75 mln PLN, co stanowi 50,12 % alokacji

Jak wynika z analizy stanu wdrażania projektów realizowanych ze środków EFRR (Rozdz.4) oraz EFS (Rozdz.5), stopień wykorzystania alokacji dla ZIT KOF do dnia 31.12.2018 r., w podpisanych umowach o dofinansowanie, wyniósł 88,8 %. Porównując tę wartość z założeniami przyjętymi do Planu Naprawczego (78,64%), IP ZIT KOF dotrzymała swych zobowiązań, przewyższając przyjęty przez Ministerstwo procent wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o 10 punktów procentowych.

W odniesieniu do stopnia wykorzystania alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność , należy zwrócić uwagę, iż na przestrzeni całego 2018 roku uzyskano ponad 100% zakładanego poziomu wykorzystania alokacji. Szczegółowo obrazują to tabele NR 13, 15 i 16.

Reasumując, do 31 grudnia 2018 roku zostało podpisanych 93 umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFRR oraz EFS, na łączną kwotę 307,82 mln PLN, co stanowi 88,8 % wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF. Odnosząc się do wniosków o płatność - zatwierdzono dla EFS i EFRR wnioski na kwotę 93,11 mln pln, co stanowi 27% wykorzystania alokacji dedykowanej ZIT KOF.

Działania Instytucji Pośredniczącej ZIT KOF przy wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych na lata 2014-2020, należy ocenić bardzo dobrze. Stopień realizacji zakładanych poziomów kontraktacji i realizacji wniosków o płatność, na koniec 2017 roku, został osiągnięty.

Prawidłowość realizacji zadań przez IP ZIT potwierdzona została kontrolą systemową przeprowadzoną przez IZ RPOWŚ w dniach 01÷12 czerwca 2017 r. Kontrola z zakresu nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości ani uchybień.

Zakładany w osi priorytetowej 6 cel główny, tj. stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska jest realizowany zgodnie z założeniami przy zachowaniu odpowiedniej efektywności wdrażania. Należy pozytywnie ocenić wdrażanie działań w formule ZIT, która to gwarantuje mniejszą konkurencję o środki, a większą współpracę między sąsiednimi samorządami w ramach KOF. Wzmacnianie i poszerzanie tych relacji będzie procentowało zwiększenie stopnia zintegrowania projektów, który do tej pory jest na wczesnym etapie zaawansowania.

W zakresie wdrażania projektów za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej należy odnotować zwiększoną dynamikę wdrażania i spełnienie założeń wdrożonego programu naprawczego, obejmującego m.in. kontraktacje. Ponadto wkład IP ZIT w realizację celów osi 6, w tym wskaźników ram wykonania jest bardzo istotny dzięki czemu wdrażanie interwencji w ramach instrumentu ZIT (działania 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz 6.6) odbywa się w sprawny sposób.

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI – OŚ PRIORYTETOWA 6

(na podstawie Raportu ewaluacyjnego RPOWŚ na lata 2014-2020)

W osi priorytetowej 6 za wysoce efektywne należy uznać inwestycje w kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia ulicznego oraz w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego. W przypadku wymienionych typów projektów, pomimo wzrostu kosztów należy spodziewać się spełnienia założeń programowych zarówno w zakresie produktowym, jak i w rezultatach. Potencjalnie najbardziej wyróżniające się, ale i obarczone największym ryzykiem sukcesu będą projekty zakładające ochronę bioróżnorodności biologicznej, wpływającym także na rozwój turystyki i rekreacji na obszarze KOF. Wzrastający udział tzw. przemysłu czasu wolnego generuje coraz większe społeczne potrzeby w tym zakresie, jednak podlegają one w wysokim stopniu sezonowości, dlatego efekty mogą być trudne do oszacowania.

Najmniejszą efektywnością wdrażania interwencji cechuje się działanie 6.4, gdzie szczególnie wyraźnie ujawnione zostały konsekwencje braku osiągnięcia konsensusu w sprawie kluczowych zadań inwestycyjnych w mieście. Projekt przebudowy ul. Witosza podlegał licznym protestom, ostatecznie udało się przeprowadzić procedurę przetargową, jednakże przedłożona oferta znacznie przekroczyła szacowaną wartość projektu. Na chwilę obecną Beneficjentowi udało się zabezpieczyć środki na realizację powyższej inwestycji.

W osi priorytetowej 6 nie zdiagnozowano projektów, które byłyby w sposób szczególne zagrożone realizacją. Trudności w realizacji projektów zdiagnozowano w działaniu 6.2 w zakresie infrastruktury rowerowej, gdzie występuje wyraźne przekroczenie wartości ofertowych względem kosztorysowych w ramach przetargów, stąd prawdopodobnie nieosiągnięte zostaną wskaźniki długości ścieżek rowerowych. Rekomenduje się zmniejszenie wielkości tego wskaźnika.
